



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde (dd/mm/aa) 01/02/2015 Hasta (dd/mm/aa) 28/02/2015

Nombre del Profesional del Servicio: Manuel Salamanca Morales

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Gladys Serrano Alegria

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Diaz Muñoz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Ma. Teresa Santodomingo Muñoz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jiménez Terranova

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Luis Eduardo Prieto Linares

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Miguel Ángel Sastoky Méndez

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Luis Francisco Castellanos

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Jaime Enrique Salazar Muñoz

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: José Edgar Romero Devia

Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Actividades	Gestión realizada
Supervisión a la actualización del Sistema de Información Georreferenciada de la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C. a cargo del operador de Alumbrado Público CODENSA S.A ESP	Se revisó en el informe No. 11 la base de infraestructura del mes de enero de 2014. Total luminarias de Alumbrado Público existentes a 21 de enero de 2015: 336.431 Se verifica que se realizó el muestreo de aceptación a la calidad a las actualizaciones en la base de datos de enero de 2015, correspondiente a 191 rótulos de cambio y 406 rótulos de expansiones, donde la interventoría recomendó el lote inspeccionado, como resultado de la aplicación del procedimiento normalizado de visitas conjuntas de muestreo efectuadas a terreno por la interventoría en compañía de los funcionarios de CODENSA SA ESP. Comunicado C-162-17468-15. Anexo A del informe.
Seguimiento al estado y la calidad del Servicio de Alumbrado Público en la ciudad.	Los usuarios reportaron durante el periodo del 1 al 31 de enero de 2015 al Fonoservicio un total de 3.193 reclamos, por fallas del Servicio de Alumbrado Público. Como resultado de las inspecciones nocturnas del periodo del 1 al 31 de enero de 2015, la interventoría reportó al Fono-servicio un total de 10.204 reclamos por fallas en el Servicio de Alumbrado Público. De los anteriores reportes se generan las Ordenes de trabajo correspondientes, las cuales se les hace seguimiento con el reporte de fechas de cumplido.
Seguimiento al resultado de las mediciones de iluminancia realizadas en campo.	En el informe No. 11 se verificó que la Interventoría realizó 50 mediciones, distribuidas de la siguiente manera: Bosa 3; Chapinero 9; Ciudad Bolívar 1; Engativá 8; Kennedy 9; Los Mártires: 4; Puente Aranda 5; Rafael Uribe 6; Teusaquillo 1; Tunjuelito 1; y Usme 3; las cuales tuvieron los siguientes resultados: 10 sectores cumplen con la normatividad vigente y se generaron cuatro (4) Acciones de Mejora, siete (7) Acciones de Mejora de Repotenciación.
Seguimiento a la Base de Fonoservicio (solicitudes telefónicas de los usuarios al 7115115 y barridos nocturnos de interventoría).	Ordenes de trabajo generadas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas: 10.624 órdenes de trabajo atendidas de 11.636 generadas en el mes de enero para un porcentaje de atención del 91,30%. Meta no contractual del 90%. Indicador de la Contraloría. Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de enero de 2015 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independiente de la fecha de generación: 10.875 órdenes de trabajo atendidas de 15.136 generadas para un porcentaje de atención del 71,85%. Meta no contractual del 90%. Total rótulos reparados en cumplimiento de la atención de reclamos entre el 1 y el 31 de enero de 2015:



	<p>19.182</p> <p>Rótulos afectados por vandalismo: 37</p> <p>Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero y que al 5 de febrero de 2015 no tenían reporte de cumplimiento: 1.908. Se envió comunicado a Codensa 20153010032041 para su atención inmediata. De 3.543 pendientes se paso a 1.908 pendientes.</p>																												
<p>Seguimiento a las expansiones realizadas por el operador.</p>	<p>Se realizó el Comité de Expansiones No. 270 el día 12 de febrero de 2015, con participación de CODENSA – UAESP – Interventoría donde se presentaron los avances de los diferentes proyectos, así como los nuevos para aprobación.</p> <p>Se realizó el Comité de Expansiones No. 271 el día 26 de febrero de 2015, con participación de CODENSA – UAESP e Interventoría donde se presentaron los avances de los diferentes proyectos, así como los nuevos para aprobación.</p> <p>Se verifica en el informe No. 11 de febrero de 2015, se efectuó la visita a las expansiones ejecutadas por CODENSA SA ESP en el mes de octubre de 2014 en el cual se presentaron 95 proyectos de expansión correspondiente a 239 luminarias y se aprobaron los 95.</p>																												
<p>Revisión y aprobación de diseños fotométricos.</p>	<p>Relación de los proyectos Fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP:</p> <table border="1" data-bbox="646 789 1373 919"> <thead> <tr> <th>No. de Aprobación</th> <th>Nombre del Proyecto</th> <th>Dirección del proyecto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>006-15</td> <td>Parque Serrania</td> <td>Entre las CL 77B Sur y CL 78 Bis Sur</td> </tr> <tr> <td>007-15</td> <td>Parque Urbanización Segal</td> <td>AK 1 con CL 65A</td> </tr> </tbody> </table>	No. de Aprobación	Nombre del Proyecto	Dirección del proyecto	006-15	Parque Serrania	Entre las CL 77B Sur y CL 78 Bis Sur	007-15	Parque Urbanización Segal	AK 1 con CL 65A																			
No. de Aprobación	Nombre del Proyecto	Dirección del proyecto																											
006-15	Parque Serrania	Entre las CL 77B Sur y CL 78 Bis Sur																											
007-15	Parque Urbanización Segal	AK 1 con CL 65A																											
<p>Recibo de infraestructura, conjuntamente con interventoría y el operador.</p>	<p>Relación de infraestructura recibida por la UAESP conjuntamente con Interventoría y Codensa:</p> <table border="1" data-bbox="566 974 1455 1272"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Nombre</th> <th>Dirección</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Parque Paraíso</td> <td>CL 70A Bis No. 117-15</td> <td>Aprobado 05-02-2015</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Parque Belair</td> <td>CL 153 No. 6-33</td> <td>Aprobado 17-02-2015</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Parque El Ensueño</td> <td>TV 70C No. 68-33 Sur</td> <td>Aprobado 19-02-2015</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Parque Almenara</td> <td>KR 145 No. 114C-72</td> <td>Aprobado 20-02-2015</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Parque Portón Verde</td> <td>CL 128 Bis No. 92B-03</td> <td>Aprobado 25-02-2015</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Parque Américas I</td> <td>KR 87ª con CL 49C Sur</td> <td>Rechazado 25-02-2015</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Nombre	Dirección	Resultado	1	Parque Paraíso	CL 70A Bis No. 117-15	Aprobado 05-02-2015	2	Parque Belair	CL 153 No. 6-33	Aprobado 17-02-2015	3	Parque El Ensueño	TV 70C No. 68-33 Sur	Aprobado 19-02-2015	4	Parque Almenara	KR 145 No. 114C-72	Aprobado 20-02-2015	5	Parque Portón Verde	CL 128 Bis No. 92B-03	Aprobado 25-02-2015	6	Parque Américas I	KR 87ª con CL 49C Sur	Rechazado 25-02-2015
Item	Nombre	Dirección	Resultado																										
1	Parque Paraíso	CL 70A Bis No. 117-15	Aprobado 05-02-2015																										
2	Parque Belair	CL 153 No. 6-33	Aprobado 17-02-2015																										
3	Parque El Ensueño	TV 70C No. 68-33 Sur	Aprobado 19-02-2015																										
4	Parque Almenara	KR 145 No. 114C-72	Aprobado 20-02-2015																										
5	Parque Portón Verde	CL 128 Bis No. 92B-03	Aprobado 25-02-2015																										
6	Parque Américas I	KR 87ª con CL 49C Sur	Rechazado 25-02-2015																										
<p>Aprobación de Unidades Constructivas de Alumbrado Público. Cada vez que aparezca y sea aprobado un nuevo ítem. Actualización de Unidades Constructivas Existentes de Alumbrado Público. Cada Año con IPC e IPP y cada 5 años con los precios del mercado vigentes para los ítems existentes.</p>	<p>Para el mes de enero de 2015 no se presentaron Unidades Constructivas para aprobar.</p>																												
<p>Seguimiento al Convenio 766 de 1997 y al Acuerdo Complementario de 2002.</p>	<p>Se verificó en el informe que la interventoría realizó el seguimiento al convenio No. 766 de 1997 y al Acuerdo entre el distrito capital y la UESP (UAESP) del 25 de enero del 2002 y se indicaron las observaciones correspondientes a Interventoría.</p>																												
<p>Seguimiento a las No Conformidades (Acciones correctivas, preventivas o de mejora)</p>	<p>Al contrastar la información reportada en el informe de actividades de la Interventoría del mes de Febrero de 2015, con el registro de comunicaciones que fueron entregadas para aval de la UAESP por parte de la Interventoría y el registro de comunicaciones que fueron entregadas a Codensa S.A. ESP durante el mes de Febrero de 2015, se tiene el siguiente consolidado de información relacionada con las Acciones de Mejora (AM) y No Conformidades (NC) tramitadas por parte de la Interventoría al Operador:</p> <table border="1" data-bbox="594 1692 1442 1934"> <thead> <tr> <th>Tipo de solicitud</th> <th>No. de solicitudes Recibidas de interventoría</th> <th>No. de solicitudes entregadas a Codensa</th> <th>No. de solicitudes cerradas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACCIÓN DE MEJORA (AM)</td> <td>65</td> <td>47</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>NO CONFORMIDAD (NC)</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SAC</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>SMAP</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de solicitud	No. de solicitudes Recibidas de interventoría	No. de solicitudes entregadas a Codensa	No. de solicitudes cerradas	ACCIÓN DE MEJORA (AM)	65	47	84	NO CONFORMIDAD (NC)	3	1	1	SAC	*	*	16	SMAP	*	*	15								
Tipo de solicitud	No. de solicitudes Recibidas de interventoría	No. de solicitudes entregadas a Codensa	No. de solicitudes cerradas																										
ACCIÓN DE MEJORA (AM)	65	47	84																										
NO CONFORMIDAD (NC)	3	1	1																										
SAC	*	*	16																										
SMAP	*	*	15																										



EXPANSIONES	*	*	7
TOTAL	68	48	123

*A partir del contrato de Interventoría 162 de 2014 a las Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), Solicitudes de Mejora de Alumbrado Público (SMAP) y a las Expansiones de Alumbrado Público se las comenzó a denominar Acciones de Mejora (AM), Acciones de Mejora de Repotenciación (AM de REP) y Acciones de Mejora de Expansiones (AM de EXP) respectivamente. Lo anterior para que las definiciones correspondan con las de las Normas Técnicas de Calidad.

Seguimiento a los conceptos emitidos por parte de la interventoría sobre reglamentos, normativa técnica, económica, regulatoria y jurídica, financiera aplicables al servicio. Revisión y aplicación de la nuevas leyes, decretos y normas que sean aplicables al A.P.

Conceptos emitidos por la interventoría durante el mes de febrero.
- Acción Popular 25000-23-24-000-2002-2738 Parque La Florida, radicado 20156010028372
- Concepto, análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de Alumbrado Público del mes de diciembre de 2014, 20156010032312 del 13 de febrero de 2015.
- Concepto, análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de Alumbrado Público del mes de enero, 20156010042402 del 25 de febrero de 2015. del mes de enero Informe de resultados de muestreo de aceptación de calidad a las actualizaciones de la base de datos del ms de enero de 2015, radicado 20156010041362.

Seguimiento al Proyecto de Modernización, cambio a tecnología Led.

Enero - Total luminarias instaladas en enero: 2.613
Av. Caracas con CL 19 = 14; Av. Caracas con CL 13 = 19; Av. Caracas entre CL6 y CL 26 = 128; Av. Caracas entre CL 44 sur y CL 27 sur = 125; Av. CL 19 entre Américas y KR 3 = 264; Av. Jimenez KR 3 y Av. Caracas = 133; Av. Villas entre CL 127 y CL 152 = 42; CL 1 entre KR 10 y KR 27 = 122; CL 152 entre Auto Norte y Av. Villas = 5; CL 17 entre KR 5 y KR 9 = 10; CL 22 entre KR 5 y KR 7 = 9; CL 23 entre KR 5 y KR 7 = 23; CL 3 entre KR 68 y KR 19 (Av Mariscal) = 133; CL 34 entre El Concejo de Bogotá y la KR 13 = -3 (en diciembre se reportaron 55 pero se instalaron 52); CL 45 entre KR 13 y KR 30 = -4 (en diciembre se reportaron 105 pero se instalaron 101); CL 53 entre KR 7 y KR 68 = 173; CL 57 entre KR 13 y KR 30 = 115; CL 8 sur entre KR 27 y KR 50 = 143; KR 11 entre CL 100 y CL 64 = 306; KR 13 entre CL 13 y CL 69 = 95; KR 27 entre CL 8 sur -Glorieta y KR 50 = 196; KR 3 entre CL 13 y CL 19 = 17; KR 50 entre CL 63 y Puente Aranda = 104; KR 50 entre Puente Aranda y Auto sur = 262; KR 7 entre CL 170 y CL 234 = 116; KR 71 D = -48 (en diciembre se reportaron 106 pero se instalaron 58); San Victorino = 114. Para un Total de 2.613 luminarias instaladas en enero.

Febrero - Total luminarias instaladas en febrero: 558
Avenidas o sectores modernizados: Av. Caracas CL 27 y CL 80 = 124; Av. Caracas CL6 y CL 26 = 41; Av. Caracas entre CL 44 sur y Calle 27 sur = 16; AC 19 entre Américas y KR 3 = 4; Av. Jimenez KR 3 y Av. Caracas = 51; Av. Villas entre CL 127 y CL 152 = 2; CL 152 entre Auto Norte y Av. Villas = 1; CL 3 entre KR 68 y KR 19 (Av Mariscal) = 143; CL 34 entre el Concejo de Bogotá y KR 13 = 6; CL 45 entre KR 13 y KR 30 = 6; CL 53 entre KR 7 y KR 68 = 38; CL 57 entre KR 13 y KR 30 = 1; CL 72 entre KR 7 y Av Caracas = 2; CL 8 sur entre KR 27 y KR 50 = 8; KR 11 entre CL 100 y CL 64 = 82; KR 13 entre CL 13 y CL 69 = 25; KR 27 entre CL 8 sur -Glorieta y KR 50 = 3; KR 50 entre Puente Aranda y Auto Sur = 4. Para un total de 558 luminarias instaladas en febrero

Resumen luminarias instaladas LED año 2012 a 2015:

Año/Tecnología	LED
2012	110
2013	82
2014	1.781
2015	3.171
Total	5.144

Seguimiento al Proyecto de Subterranización

En el marco del Comité Intersectorial de Servicios Públicos que coordina la Secretaría de Hábitat, CODENSA entregó cronograma de actividades del plan de subterranización en cumplimiento del POT el cual se ejecutará por zonas que comienza en el año 2015 y termina en el año 2019.

El cronograma aprobado es el siguiente, al cual se le hará seguimiento por parte de la UAESP.

Año 2015: Localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Antonio Nariño.

Año 2016: Localidades La Candelaria, Mártires, Santa Fe, Teusaquillo, Puente Aranda, Kennedy y Bosa.

Año 2017: Localidades Usaquén y Chapinero.

Año 2018: Localidades Barrios Unidos, Engativá y Fontibón.

Año 2019: Localidades Suba, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

En el mes de enero, se adelantó el levantamiento de los siguientes tramos para subterranización, esta información se remitirá a CODENSA SA ESP para su subterranización:

CL 9 ENTRE KR 10 Y AV CARACAS = 20; AV CARACAS CALLE 36 COSTADO OCCIDENTAL = 20; KR 78 H No 60 A - 17 SUR = 100; KR 71 B CON CL 50 B SUR = 120; KR 8 CON CL 9 COSTADO OCCIDENTAL= 60; AK 9 ENTRE CL 165 Y CL 170 = 30; AV CL 68 CARRERA 72 = 90 CALLE 53 DE LA CARRERA 50 A LA KR 66 = 600.

Cantidad que se reportara a CODENSA SA ESP para subterranización en el mes de enero = 1.040 metros.

Total general reportado a CODENSA SA ESP para subterranización = 38.990 metros

La Secretaría de Hábitat en enero no convocó al Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos. La Secretaría de Hábitat en el mes de enero no convocó a la Mesa de Subterranización.



	<p>En el mes de Febrero, no se adelantó el levantamiento de tramos para subterranización. Total general reportado a CODENSA SA ESP para subterranización = 38.990 metros La Secretaría de Hábitat en febrero convocó al Sesión Ordinaria Comisión Intersectorial de Servicios Públicos, el día 04 de febrero de 2015. La Secretaría de Hábitat en el mes de febrero no convocó a la Mesa de Subterranización.</p>																
<p>Solicitud del aval mensual correspondiente a la emisión de la factura.</p>	<p>Durante el mes de Febrero de 2015 la Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público realizo la revisión, análisis, evaluación y valoración del costo del servicio de Alumbrado Público a las diferentes solicitudes de pago emitidas por el operador y emitió los conceptos respectivos a través de los siguientes radicados de entrada a la UAESP:</p> <table border="1" data-bbox="524 489 1511 846"> <thead> <tr> <th colspan="4">Conceptos emitidos por la interventoría durante el mes de febrero de 2015</th> </tr> <tr> <th>Mes de facturación del servicio de alumbrado público</th> <th>Observación</th> <th>No. de radicado UAESP</th> <th>Fecha de radicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DICIEMBRE DE 2014</td> <td>Concepto emitido por la Interventoría a la Solicitud de Pago del Operador en la que se excluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.</td> <td>20156010032312</td> <td>13/02/2015</td> </tr> <tr> <td>ENERO DE 2015</td> <td>Concepto emitido por la Interventoría a la Solicitud de Pago del Operador en la que se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.</td> <td>20156010042402</td> <td>25/02/2015</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> El día 11 de Febrero de 2015 se envió a la Interventoría vía correo electrónico copia de la solicitud de pago correspondiente al servicio de Alumbrado Público del mes de Diciembre de 2014 en la que se excluye por parte de Codensa S.A. ESP el cobro del IVA del 16% sobre el arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público, con lo cual, la Interventoría posteriormente emitió a través de la comunicación con radicado de entrada a la UAESP No.: 20156010032312 del 13 de Febrero de 2015 el concepto respectivo en relación a la solicitud de pago del mes de Diciembre de 2014. El día 23 de Febrero de 2015 se envió a la Interventoría vía correo electrónico copia de la solicitud de pago correspondiente al servicio de Alumbrado Público del mes de Enero de 2015 en la que se incluye por parte de Codensa S.A. ESP el cobro del IVA del 16% sobre el arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público, con lo cual, la Interventoría posteriormente emitió a través de la comunicación con radicado de entrada a la UAESP No.: 20156010042402 del 25 de Febrero de 2015 el concepto respectivo en relación a la solicitud de pago del mes de Diciembre de 2014. <p>Por lo anterior, la Interventoría dio cumplimiento con esta obligación, dado que realizó la entrega de los conceptos solicitados con los análisis de la facturación y costos del servicio en un plazo menor a cinco (5) días.</p>	Conceptos emitidos por la interventoría durante el mes de febrero de 2015				Mes de facturación del servicio de alumbrado público	Observación	No. de radicado UAESP	Fecha de radicado	DICIEMBRE DE 2014	Concepto emitido por la Interventoría a la Solicitud de Pago del Operador en la que se excluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20156010032312	13/02/2015	ENERO DE 2015	Concepto emitido por la Interventoría a la Solicitud de Pago del Operador en la que se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20156010042402	25/02/2015
Conceptos emitidos por la interventoría durante el mes de febrero de 2015																	
Mes de facturación del servicio de alumbrado público	Observación	No. de radicado UAESP	Fecha de radicado														
DICIEMBRE DE 2014	Concepto emitido por la Interventoría a la Solicitud de Pago del Operador en la que se excluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20156010032312	13/02/2015														
ENERO DE 2015	Concepto emitido por la Interventoría a la Solicitud de Pago del Operador en la que se incluye el cobro del IVA del 16 % sobre el Arrendamiento de la Infraestructura de Alumbrado Público.	20156010042402	25/02/2015														
<p>Gestión Social</p>	<p>En proceso de contratación por parte de la UAESP de personal para acompañamiento de recorridos. Recorridos realizados por la Interventoría con la comunidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Localidad de Engativá, 3 de febrero de 2015. - Localidad de Santa Fé, 5 de febrero de 2015. - Localidad de Teusaquillo, 9 de febrero de 2015. - Localidad de Suba, 12 de febrero de 2015. - Localidad de Bosa, 12 de febrero de 2015. - Localidad de Engativá, 17 de febrero de 2015. - Localidad de Bosa, 19 de febrero de 2015. - Localidad de Bosa, 26 de febrero de 2015. 																
<p>Elaborar los informes de supervisión y Control.</p>	<p>Se han elaborado los informes hasta enero de 2015.</p>																
<p>Liquidar contrato de interventoría.</p>	<p>A partir del mes de mayo de 2015.</p>																

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO			
Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
5/02/2015	Presentación Aplicativo Movilia - Interventoría de Alumbrado Público	UAESP - INTERVENTORÍA	La Interventoría a la prestación del servicio de Alumbrado Público realizó la presentación del funcionamiento del aplicativo Movilia desarrollado para la supervisión del servicio
10/02/2015	Capacitación en el manejo del Modulo de Equipos del Sistema de Información KAWAK	UAESP	Se realizó la capacitación en el manejo del Modulo de Equipos del Sistema de Información KAWAK por parte de personal experto en la administración de esta plataforma.



	KAWAK		
10/02/2015	Capacitación en el manejo del Modulo de Auditorias del Sistema de Información KAWAK	UAESP	Se realizó la capacitación en el manejo del Modulo de Auditorias del Sistema de Información KAWAK por parte de personal experto en la administración de esta plataforma.
11/02/2015	Capacitación en el manejo de los Módulos de Indicadores, Mejoramiento Continuo y Riesgos del Sistema de Información KAWAK	UAESP	Se realizó la capacitación en el manejo de los Módulos de Indicadores, Mejoramiento Continuo y Riesgos del Sistema de Información KAWAK por parte de personal experto en la administración de esta plataforma.
16/02/2015	Integración de la información georeferenciada de cada servicio de la UAESP en una sola plataforma.	UAESP (ALUMBRADO PÚBLICO, RBL Y TIC).	Viabilidad de integrar la información georeferenciada de cada servicio de la UAESP utilizando la infraestructura tecnológica del Distrito Capital (Anillo de Fibra Óptica).
17/02/2015	Interconexión de la UAESP al anillo de fibra óptica del Distrito.	UAESP (ALUMBRADO PÚBLICO, RBL Y TIC) - ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC.	Se realizó la socialización por parte del profesional de la Alta Consejería Distrital de TIC del anillo de fibra óptica de propiedad del Distrito al cual se han venido conectando diversas entidades y esta próxima por ser conectada la UAESP. La conexión a este anillo de fibra óptica distrital trae muchos beneficios como internet de alta velocidad, telefonía IP entre las entidades conectas, alojamiento de aplicativos en la nube privada dl distrito.
25-02-2015	Presentación del informe No. 11	CODENSA INTERVENTORÍA UAESP	Presentación Informe de actividades realizadas por la Interventoría durante el mes de enero de 2015
25/02/2015	Revisión de Indicadores de Gestión de Alumbrado Público - Vigencia 2015	UAESP (ALUMBRADO PÚBLICO)	Se realizó la revisión de los Indicadores de Gestión de Alumbrado Público de la vigencia 2014, en donde se tomo la decisión de eliminar el Indicador "Proyectos de mejora implementados en el Servicio de Alumbrado Público".
25/02/2015	Presentación Sistema de Telegestión de Alumbrado Público - Philips	UAESP - PHILIPS	La empresa Philips realizó la presentación Sistema de Telegestión de Alumbrado Público, en donde se expuso el funcionamiento, las ventajas y algunos sitios donde a sido instalado este sistema.
26/02/2015	Simulacro Manejo de Cadáveres	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL - UAESP - IDIGER - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - IDRD - MEDICINA LEGAL	Se asistió a la mesa de trabajo interinstitucional con el fin de coordinar la ejecución del simulacro distrital de manejo de cadáveres para garantizar la iluminación en el sitio del simulacro.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO³

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la Interventoría en el informe N° 11 de febrero de 2015 y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador:

Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el Fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.

En el periodo del 1 al 28 de febrero de 2015, donde se analizó la base de datos de Enero de 2015, el 91,30% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas del mes. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual). El 71,85% de las órdenes de trabajo atendidas fueron atendidas independientes de la fecha de generación en tiempos inferiores a 72 horas. No se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual).

Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP.

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos de obra se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.

De la comparación de las bases de datos de diciembre de 2014 y enero de 2015, se encontraron los cambios normales dentro del manejo de la información.

Seguimiento de los correctivos implementados a los requerimientos de la Interventoría.

Contrato 162-2014: Respecto a:

Acciones de Mejora (AM): cerradas 84

No Conformidades(NC): cerradas 1

Contrato 446-2009:

Solicitud de Acción Correctiva (SAC): cerradas 16

Solicitud de mejora de AP (SMAP): cerradas 15

Expansiones: cerradas 7



³ Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES ACCIÓN PREVENTIVA, CORRECTIVA Y DE MEJORA⁴

(Tipo: AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva AM: Acción de Mejora)

OBSERVACIÓN O HALLAZGO	TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD
SAC	Descripción de las Solicitudes de Acción Correctiva -SAC Cerradas					
SAC 1326		Cambio de nueve luminarias de 250 de sodio.				
SAC 1338		Soluciones a deficiencias de iluminación de nueve vías de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problemas fin de vida útil de las Bombillas.				
SAC 1433		Normalización de la infraestructura del servicio de Alumbrado Público en la Avenida Calle 63 entre la Avenida 68 y la Avenida Rojas, con subir luminarias a la punta del poste.				
SAC 1544		Soluciones a deficiencias de iluminación de 4 tramos de vías de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin vida útil de la bombilla / Limpieza Conjunto Óptico.				
SAC 1653		Modernizar e Independizar Luminarias en la Cl 7 A No. 74-04, Barrio Castilla- Localidad de Kennedy.				
SAC 1812		Soluciones a deficiencias de iluminación de 3 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil bombilla /Limpieza conjunto óptico/ Demasiada Interdistancia.				
SAC 1821		Soluciones a deficiencias de iluminación de 4 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil de la luminaria / Limpieza Conjunto Óptico Luminaria.				
SAC 1841		Soluciones a deficiencias de iluminación de 6 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Luminaria emite poca luz hacia los lados.				
SAC 1842		Soluciones a deficiencias de iluminación de 3 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Demasiada Interdistancia.				
SAC 1843		Soluciones a deficiencias de iluminación de 4 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Altura de Montaje.				
SAC 1854		Soluciones a deficiencias de iluminación de 3 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Luminaria emite poca luz hacia los lados.				
SAC 1855		Soluciones a deficiencias de iluminación de 4 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Altura de Montaje de la Luminaria.				
SAC 1867		Soluciones a deficiencias de iluminación de 7 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Luminaria emite poca luz hacia los lados.				
SAC 1868		Soluciones a deficiencias de iluminación de 4 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Altura de Montaje de la Luminaria.				
SAC 1872		Soluciones a deficiencias de iluminación de 3 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Fin de vida útil de la bombilla, Limpieza Conjunto Óptico de la Luminaria, Luminaria emite poca luz hacia los lados.				
SAC 1886		Soluciones a deficiencias de iluminación de 2 tramos de vía de acuerdo con las mediciones de iluminancia realizadas, problema: Modificar Reglaje Luminaria.				
SMAP	Descripción de las Solicitudes de Mejora de Alumbrado Pública CERRADAS					
SMAP 174		SMAP 174 en carrera 90 entre Avenida Calle 90 y calle 87 de la Localidad de Engativá Recorrido Interlumbrado				
SMAP 178		SMAP 178 en calle 12 C entre carrera 71B Bis y carrera 71D de la localidad de Kennedy Recorrido UAESP				
SMAP 180		MAP 180 en carrera 71D entre calle 12C y calle 12B de la Localidad de Kennedy Recorrido UAESP				
SMAP 209		Mejoramiento del Alumbrado Público 209, en C7 SUR K 18 A K 19 de la Localidad de Antonio Nariño, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido FAX 026-04.				
SMAP 213		Mejoramiento del Alumbrado Público 213, en DG 146 CON K 136 A de la Localidad de Suba, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido E-mail				
SMAP 263		Mejoramiento del Alumbrado Público 263, en K 70 entre AC 170 y AC 183 de la Localidad de Suba, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido de nuestra Interventoría.				
SMAP 288		Mejoramiento del Alumbrado Público 288, en AC 153 entre K 54 y Auto Norte de la Localidad de Suba, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido de nuestra Interventoría.				
SMAP 307		Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 307, en K 107 entre C 77 D y C 78 A de la Localidad de Engativá, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido nuestra Interventoría.				
SMAP 343		Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 343, en K 20 entre C 121 y C 124 de la Localidad de Usaquén, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido INTERALUMBRADO				
SMAP 376		Solicitud de mejoramiento de Alumbrado Público SMAP 376. En la Calle 91 entre las Carreras 15 y 16. Resultado del recorrido del 29 de octubre en la Localidad de Chapinero. Comunicación email 29/10/10				
SMAP 468		Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 468, en C 27 ENTRE AK 50 Y K 51 de la Localidad de Teusaquillo, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido INTERALUMBRADO				
SMAP 551		Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 551 en el tramo de vía de la C 64 C entre K122A y el No. 121-19 de la Localidad de Engativá, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido Interlumbrado.				
SMAP 624		Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 624 en el tramo de vía de CL 51 ENTRE AK 72 Y AK 70 de la Localidad de Engativá, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia. Recorrido Interlumbrado				
SMAP 683		Solicitud de Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 683.				
SMAP 770		Mejoramiento del Alumbrado Público SMAP 770, en el tramo de vía de CL 191 ENTRE KR 7 Y KR 9, de la Localidad de				



Usaquén, con base en los resultados de las mediciones de Iluminancia.

Expansiones cerradas generadas en el Contrato 446-2009


EXP	Dirección	Descripción	Localidad	Estado
C-446-11137	TV 78 J No 69 A – 03 Sur	Se requiere expansión del servicio con Una (1) luminaria de 150 W-Na y poste de 10 m.	Bosa	Ejecutada
C-446-11756	KR 1 A Este No. 76 – 26	Se requiere expansión del servicio con Una (1) luminaria de 70 W-Na y poste de 10 m.	Chapinero	Ejecutada
C-446-11998	CL 4 F Bis con KR 44	Se requiere expansión del servicio con Dos (2) luminarias de 150 W-Na y Dos (2) postes de 10 m.	Puente Aranda	Ejecutada
C-446-14283	AK 80 entre CL 59 Sur y CL 63 Sur (senderos peatonales) y Parque IDRD código 07-171.	Se requiere expansión del servicio con Seis (6) luminarias de 70 W-Na, Cinco (5) luminarias de 150 W-Na y Cuatro (4) Postes de 10 m.	Bosa	Ejecutada
C-446-14783	KR 69 No. 63 F - 68	Se requiere expansión del servicio con Una (1) luminaria de 70 W-Na, Adosada.	Engativá	Ejecutada
C-446-14813	AC 34 con TV 29	Se requiere expansión del servicio, con Seis (6) luminarias de 150 W-Na y Tres (3) postes de 10 m.	Teusaquillo	Ejecutada
C-446-16446	CL 18 Sur No. 37 B - 06	AM-284 Se requiere expansión del servicio, con Una (1) luminaria de 70 W, junto al rótulo 705621.	Puente Aranda	Ejecutada

Acciones de Mejora de Expansiones – AM-EXP Cerradas generadas en el Contrato 162-2014

AM 053 de EXP 020	Solicitud de Revisión del Servicio de Alumbrado Público en algunos sectores del Barrio Villamayor – Localidad Antonio Nariño.
AM 143 de EXP 032	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Santa Helena - Localidad de Suba.
AM 095 de EXP 041	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Carvajal - Localidad de Kennedy.
AM 101 de EXP 043	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio El Carmelo de la Localidad de Kennedy
AM 118 de EXP 047	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio El Palmar de la Localidad de Suba.
AM 121 de EXP 049	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Ciudad Hunza - Localidad de Suba.
AM 126 de EXP 050	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en los Barrios Laguneta y Venecia - Localidad de Tunjuelito
AM 127 de EXP 051	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Villa Any de la Localidad de Bosa.
AM 081 de EXP 052	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en los Barrios La Reforma y Alfonso López - Localidad de Usme.
AM 134 de EXP 055	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Villa Sonia - Localidad de Usme.
AM 162 de EXP 065	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio La Independencia - Localidad de Bosa.
AM 165 de EXP 067	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio La Asunción - Localidad de Puente Aranda
AM 172 de EXP 073	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Diana Turbay de la Localidad de Rafael Uribe.
AM 175 de EXP 075	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Pastrana de la Localidad de Kennedy
AM 180 de EXP 076	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Tabor de la Localidad de Suba.
AM 181 de EXP 077	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Los Laches de la Localidad de Los Mártires.
AM 183 de EXP 078	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en algunos Barrios de la Localidad de Usme.
AM 184 de EXP 079	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en algunos Barrios de la Localidad de Usme.
AM 189 de EXP 082	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Pablo VI - Localidad de Teusaquillo
AM 191 de EXP 083	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en algunos sectores de la Localidad de Engativá.
AM 193 de EXP 084	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio San Cristóbal de la Localidad de Usaquén
AM 194 de EXP 085	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Las Margaritas de la Localidad de Kennedy
AM 196 de EXP 086	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Valparaiso de la Localidad de San Cristóbal.
AM 197 de EXP 087	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Rincón de la Localidad de Suba
AM 240 de EXP 088	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Villa María de la Localidad de Suba.
AM 199 de EXP 089	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio La Fiscala de la Localidad de Usme.
AM 241 de EXP 090	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Monte Blanco de la Localidad de Usme.
AM 201 de EXP 091	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Garcés Navas de la Localidad de Engativá.
AM 202 de EXP 092	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio San Fernando de la Localidad de Barrios Unidos.
AM 203 de EXP 093	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio San Jorge de la Localidad de Rafael Uribe.
AM 203 de EXP 093	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio San Jorge de la Localidad de Rafael Uribe.
AM 206 de EXP 096	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Lucero - Localidad de Ciudad Bolívar
AM 212 de EXP 097	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Fortuna Alta - Localidad de Usme.
AM 198 de EXP 098	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Villa Anita de la Localidad de Usme.
AM 213 de EXP 098	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Abraham Lincoln - Localidad de Usme.
AM 215 de EXP 099	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en algunos Barrios de la Localidad de Suba.
AM 216 de EXP 100	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Lagos de Suba de la Localidad de Suba.
AM 228 de EXP 101	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Villa Alejandria de la Localidad de Usme
AM 230 de EXP 102	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en la KR 78 entre DG 73 G y DG 73H Sur, Barrio Manzanares – Loc. Bosa
AM 231 de EXP 103	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en la KR 77 B con CL 72 A, Barrio Tabora – Localidad Engativá.
AM 234 de EXP 105	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio La Paz – Localidad Bosa.
AM 235 de EXP 106	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Tres Reyes – Localidad Ciudad Bolívar
AM 236 de EXP 107	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Gran Granada – Localidad Ciudad Engativá
AM 237 de EXP 108	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en la KR 14 con CL 164 A, Barrio San Cristóbal – Localidad Usaquén.
AM 239 de EXP 109	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Simón Bolívar de la Localidad de Barrios Unidos.
AM 200 de EXP 111	Expansiones Recorridos Interventoría/ Obligación Contractual.
AM 255 de EXP 117	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio San Blas de la Localidad de San Cristóbal.
AM 256 de EXP 118	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio La Carolina de la Localidad de Rafael Uribe
AM 257 de EXP 119	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en El Barrio Pradera de la Localidad de Engativá.
AM 262 de EXP 122	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en la CL 48 W Sur con KR 5 J, Barrio Marruecos – Localidad Rafael Uribe.
AM 264 de EXP 123	Solicitud de Expansión del Servicio de Alumbrado Público en el Barrio Altos del Totumo – Localidad Suba.



Solicitudes atendidas en un tiempo menor a 72 horas

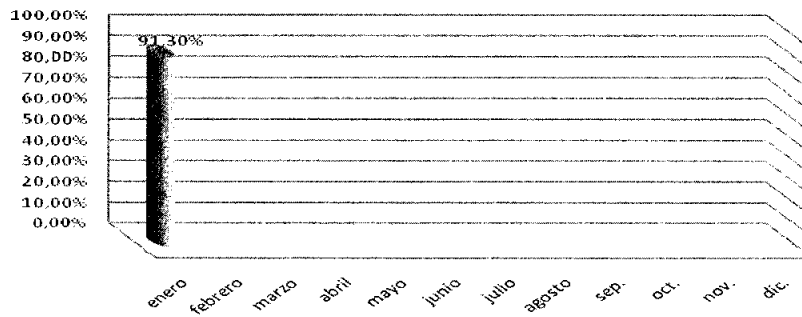


En enero de 2015 se generaron 11.636 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 91,30% que corresponde a 10.624. Meta: 90%.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SDQS

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS: Meta: 60%. Bimensual

Periodo 2015	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Total
Variables							
Atendidas	36						36
Recibidas	139						139
% de Atención	26%						26%

Atención de PQRS a través del Sistema SDQS

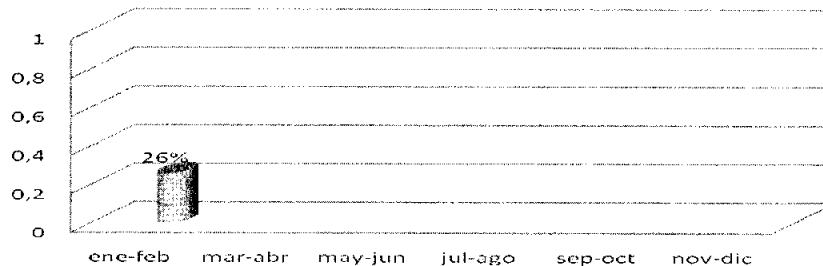

En enero de 2015 se recibieron 139 requerimientos de los cuales se atendieron el 26% que corresponden a 36 solicitudes.

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA¹

PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento de Luminarias en Falla o Apagadas (13)	De las órdenes generadas se atendieron el 57,03%.
Arreglo daño subterráneo (12)	De las órdenes generadas se atendieron el 28,27%.

De 16.417 órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero de 2015 y cumplidos del 1 al 31 de enero de 2015, se atendieron 9.362 que corresponden al 57,03% (mantenimiento de luminarias apagadas).

De 16.417 órdenes de trabajo generadas antes del 31 de enero de 2015 y cumplidos del 1 al 31 de enero de 2015, se atendieron 4.641 que corresponden al 28,27% (arreglo daño subterráneo).

¹ Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)

Indicadores

Los siguientes son indicadores que se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio, y con un seguimiento mensual permiten verificar una evolución del mismo. Estos indicadores No son contractuales con el Operador del Servicio de Alumbrado Público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:

- o Proyectos de expansión del servicio de Alumbrado Público



Proyectos de Expansión Ejecutados dentro del mes programado.

Periodo 2015. Meta 95%

Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	108	174											
# proyectos de expansión programados	114	192											
Resultado %	95%	91%											
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	35	6											
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	143	180											

(Fuente: CODENSA SA ESP - INTERALUMBRADO)

o **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de Lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al Fono Servicio línea 7115115, la cual es atendida por el Operador del Servicio de Alumbrado Público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo. Para el mes de diciembre de 2014 no se presentaron lotes No Conformes.

Registro de Resultados 2015. Meta 95%

Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		8											
# Total de lotes muestreados la línea 115		8											
Resultado %		100%											

o **Lotes muestreados de los barrios diarios de interventoría**

Registro de Resultados 2015. Meta 95%

Variables	Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 conformes		31											
# Total de la muestra de la línea 115		31											
Resultado %		100%											

RECOMENDACIONES⁸

Gestionar oportuna y efectivamente la modificación del Convenio y la implementación integral de la Resolución 123 de 2011.

Estudiar y definir una posición por parte de la UAESP en relación con la naturaleza de la propiedad de la infraestructura de Alumbrado Público desarrollada por Urbanizadores en las zonas de cesión pública gratuita. Se recomienda conformar una mesa de trabajo a nivel interinstitucional con la participación del DADEP, el IDRD, el IDU, la Secretaría Distrital de Planeación.

Estudiar y definir conjuntamente con Codensa SA ESP el IVA 16% sobre la infraestructura según la Ley 1607 de 2012.

Estudiar y definir conjuntamente con Codensa SA ESP los valores por concepto de mantenimiento de los meses de septiembre, octubre, noviembre diciembre de 2014, enero y febrero de 2015.

⁸ Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: (dd/mm/aaaa) 06/04/2015 Nombre IVAN MARTIN PONCE VERA Firma
